


渋谷駅街区土地区画整理事業 工事進捗状況 (H25.7)

その1

渋谷駅東口基盤整備工事 全体写真
(平成25年7月18日撮影)

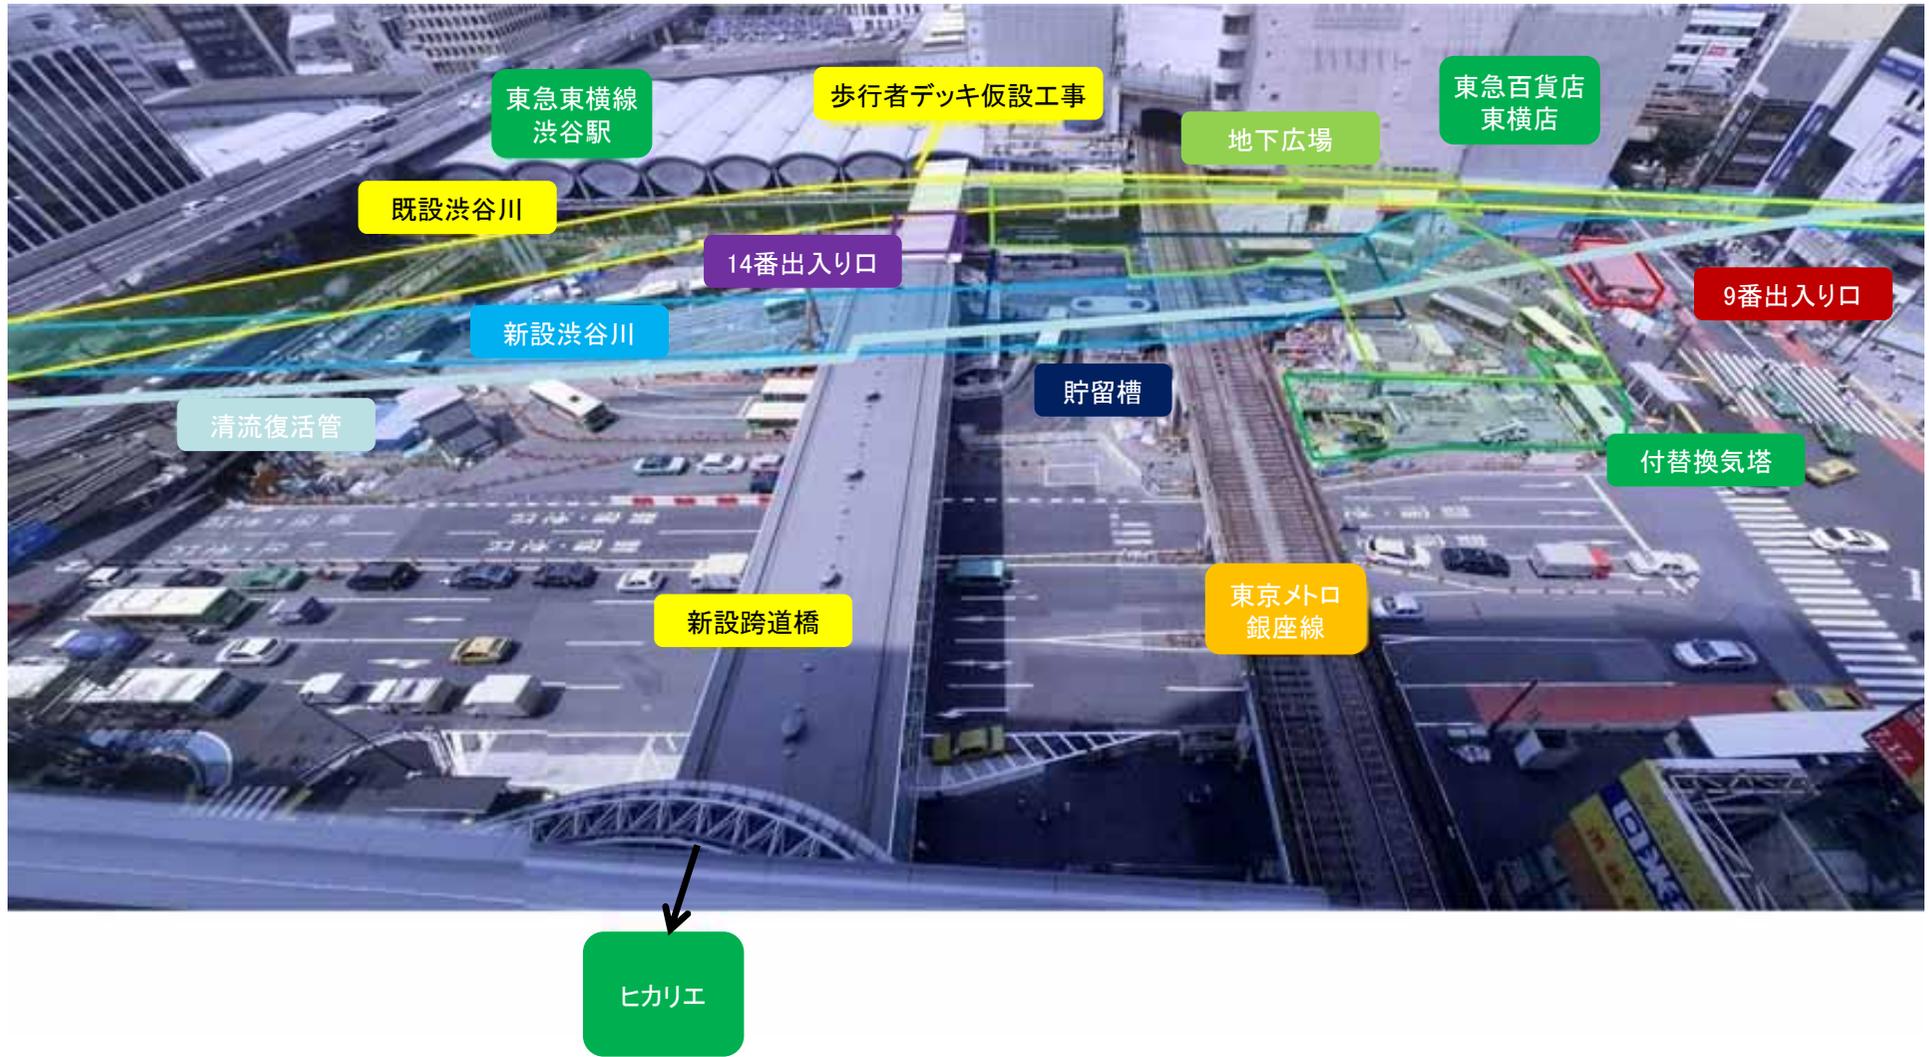

渋谷駅東口基盤整備工事 全体写真
(バスレーン切替前後)

<バスレーン切替前>



<バスレーン切替後>



渋谷駅街区土地区画整理事業に伴う
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)


3ヶ月間予定工程表

平成25年7月1日～平成25年9月30日



番号	工種	7月				8月				9月				備考
		1	10	20	30	1	10	20	31	1	10	20	30	
	準備工 交通広場改造工事	[Green bar from 7/1 to 7/15]												支障物の移設・撤去工事などを行っています。交通広場の改造工事を行います。
	布掘り・仮覆工・山留工事 (東口歩行者通路)	[Yellow bar from 7/1 to 8/10]												土砂の流出を防止するための溝を設置する工事です。その後、掘削時の中間杭の工事を行います。
	構造物解体工事 (既設跨道橋)					[Red bar from 8/1 to 9/10]								切替後の既設9番出入口を解体する工事です。
	躯体構築工事 (付替換気塔)	[Blue bar from 7/1 to 9/10]								以降継続				東口地下広場に支障となる既設換気塔を移設する工事です。新設躯体を構築した後、既設換気塔を撤去していきます。
	嵩上盛土、路面覆工工事	[Yellow bar from 7/1 to 9/10]												広場の道路高さを少しずつ上げていきます。その後覆工を広場全面に架設します。
	掘削・土留支保工事					[Yellow bar from 8/15 to 9/10]				以降継続				路面覆工架設を行ったところから、順次路下の掘削を進めていきます。

施工箇所説明写真 渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

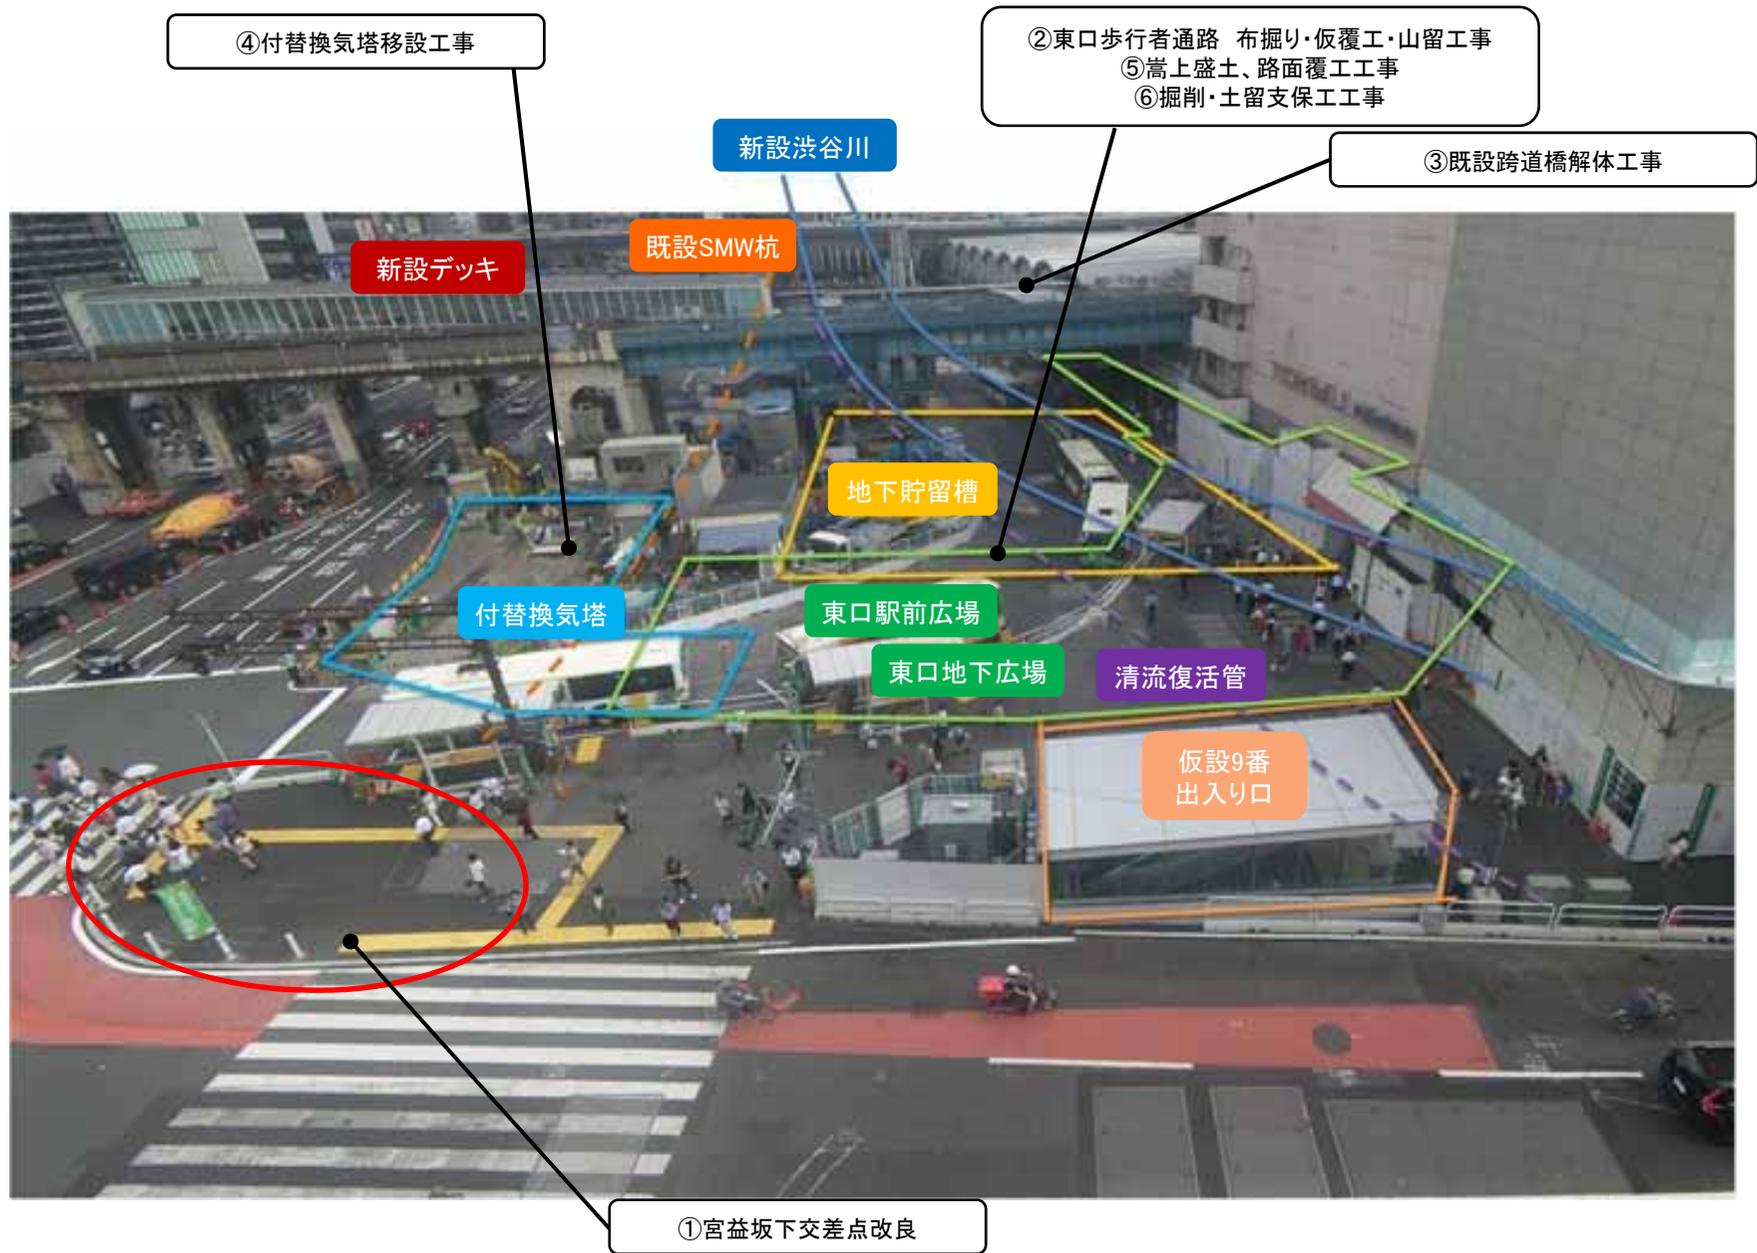

現場進捗写真(平成25年7月)
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

①東口バスロータリー全景(北側 H25.4中旬)



②東口バスロータリー全景(北側 H25.7中旬)




現場進捗写真(平成25年7月)
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

③中間杭打設状況



現場進捗写真(平成25年7月)
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

④付替換気塔構築 施工状況

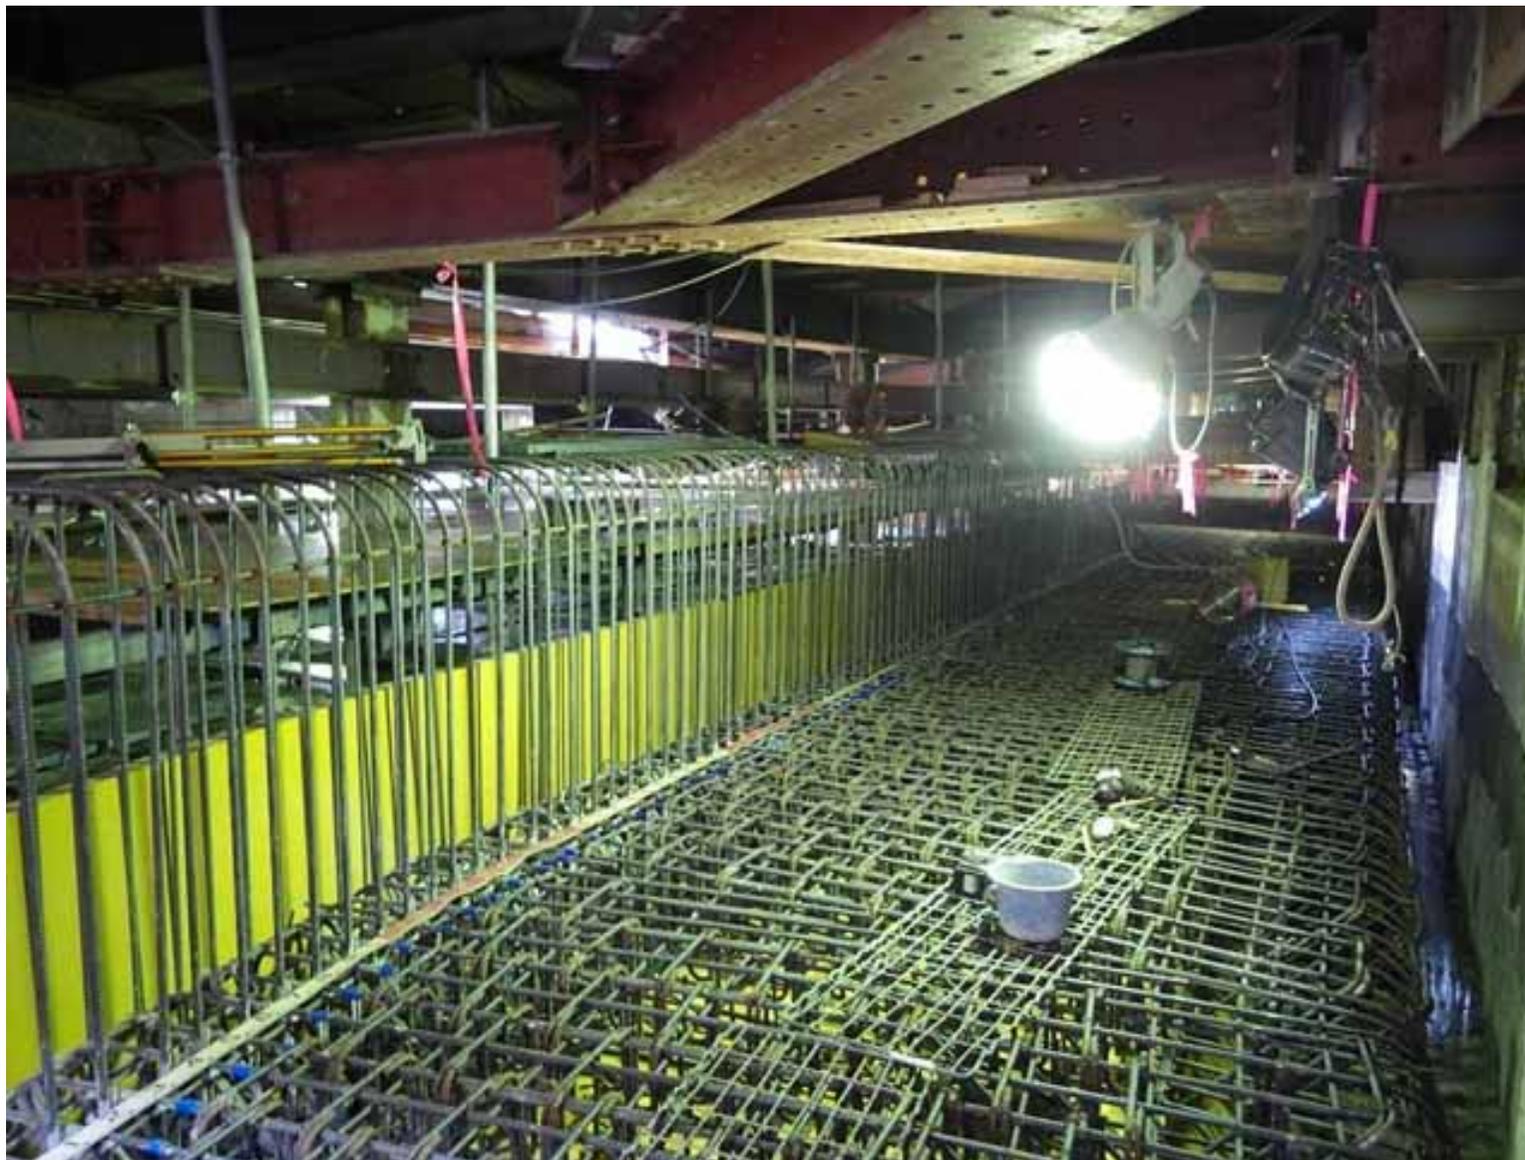

現場進捗写真(平成25年7月)
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

⑤既設14番出入口地上部撤去状況



現場進捗写真(平成25年7月)
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

⑥路面覆工 桁受設置状況



現場進捗写真(平成25年7月)
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

⑦仮覆工内 埋戻し状況

