


渋谷駅街区土地区画整理事業 工事進捗状況 (H26.1)

その1

渋谷駅東口基盤整備工事 全体写真
(平成26年1月24日撮影)

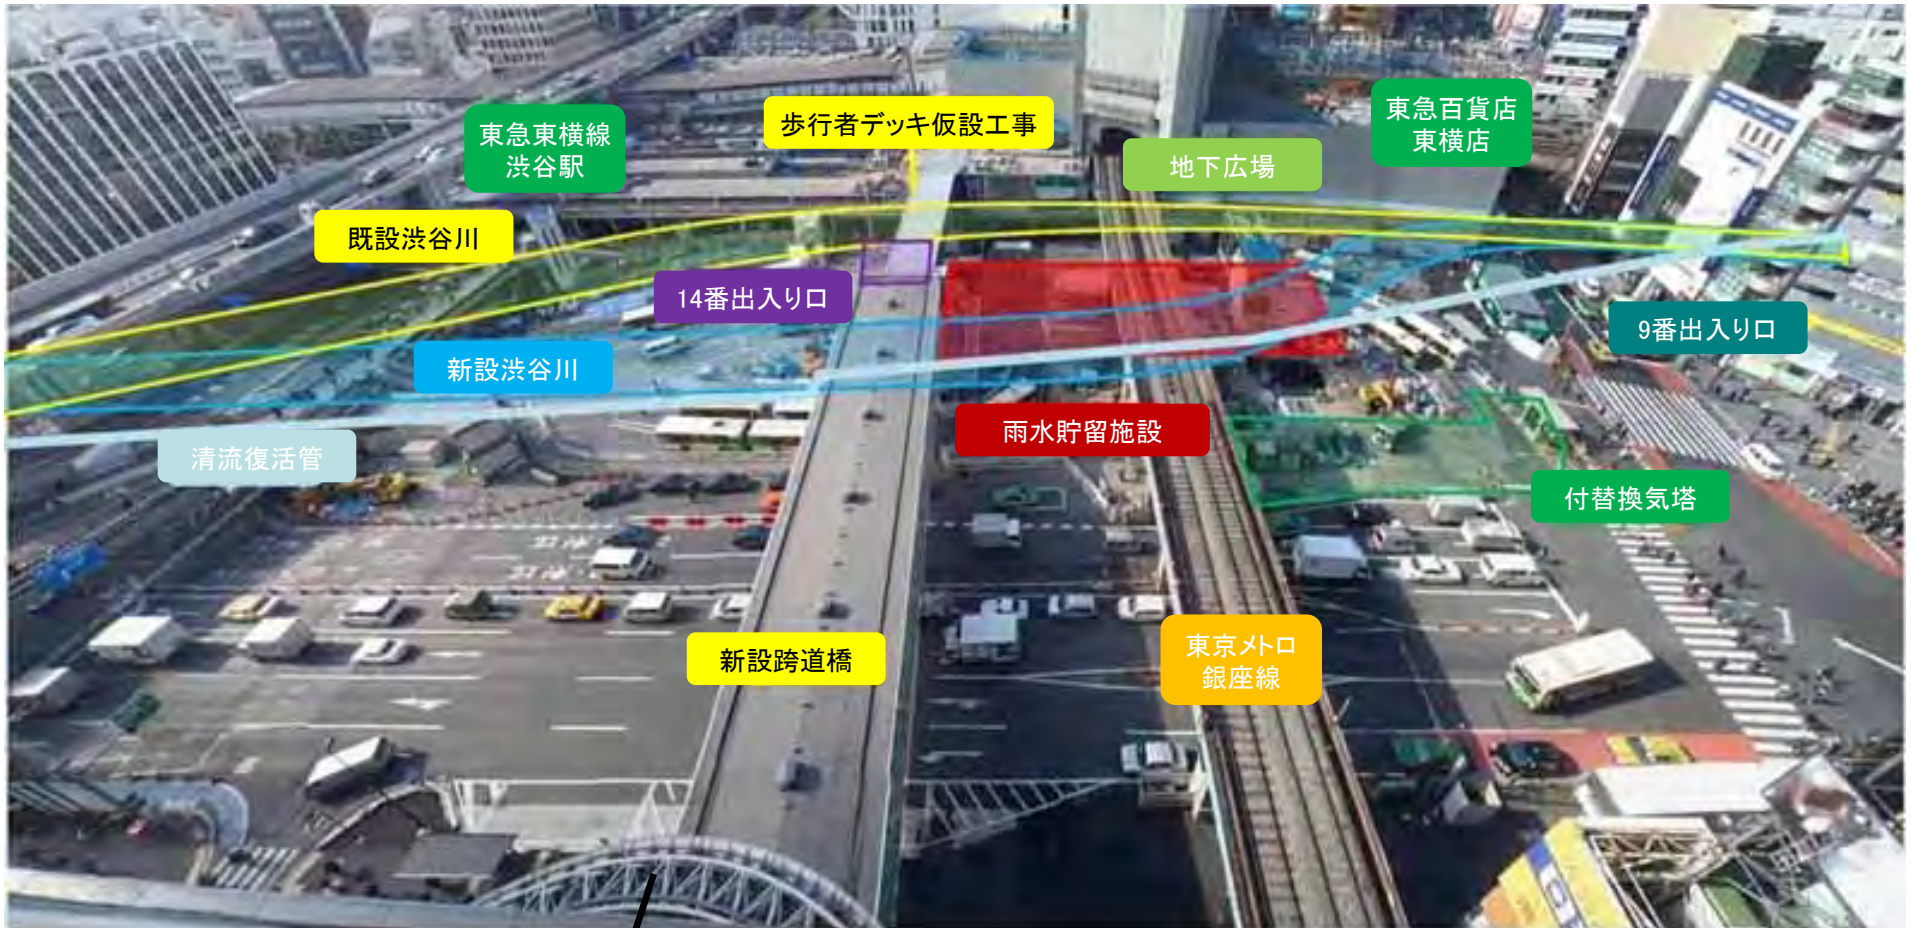

ヒカリエ

渋谷駅北地区土地区画整理事業に伴う
渋谷駅東口基礎整備工事(第1工区)

3ヶ月間予定工程表

平成26年1月1日～平成26年3月31日



番号	工種	1月			2月			3月			備考				
		1	10	20	31	1	10	20	29	31		1	10	20	31
①	躯体構築工事 (付換換気塔)														東口地下広場に支脚となる既設換気塔を移設する工事です。新設単体を構築した後、既設換気塔を撤去していきます。
②	掘削・土留支保工工事														掘削下の掘削を進めていきます。また、掘削の進捗に伴い土留が崩壊しないよう土留支保工を順次架設していきます。 以降継続
③	構造物解体工事 (旧9番・14番出入口)														地下部に残っている旧9番出入口、14番出入口を覆工の下で壊していく工事です。
④	構造物構築工事 (東口地下広場)														掘削が先行して完了する東口地下広場の躯体構築に着手していきます。 以降継続

施工箇所説明写真 渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)



①付替換気塔移設工事

②掘削・土留支保工事
③構造物解体工事(既設9番・14番出入口)

新設デッキ

新設渋谷川

既設SMW杭

東口駅前広場

地下貯留槽

付替換気塔

東口地下広場

清流復活管

仮設9番
出入口

④構造物構築工事(東口地下広場)

現場進捗写真(平成26年1月)
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

①東口バスロータリー全景(北側 H25.10中旬)



②東口バスロータリー全景(北側 H26.1下旬)



現場進捗写真(平成26年1月)
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

③付替換気塔構築 新旧接続部構築検査状況



現場進捗写真(平成26年1月)
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

④付替換気塔構築 既設換気塔撤去状況



現場進捗写真(平成26年1月)
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

⑤坑内 2次掘削状況



現場進捗写真(平成26年1月)
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

⑥既設9番出入口 解体状況



現場進捗写真(平成26年1月)
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

⑦清流復活管部先行掘削 6次掘削状況

