


渋谷駅街区土地区画整理事業  
工事進捗状況  
(H26.7)

その1

渋谷駅東口基盤整備工事 全体写真  
(平成26年7月16日撮影)

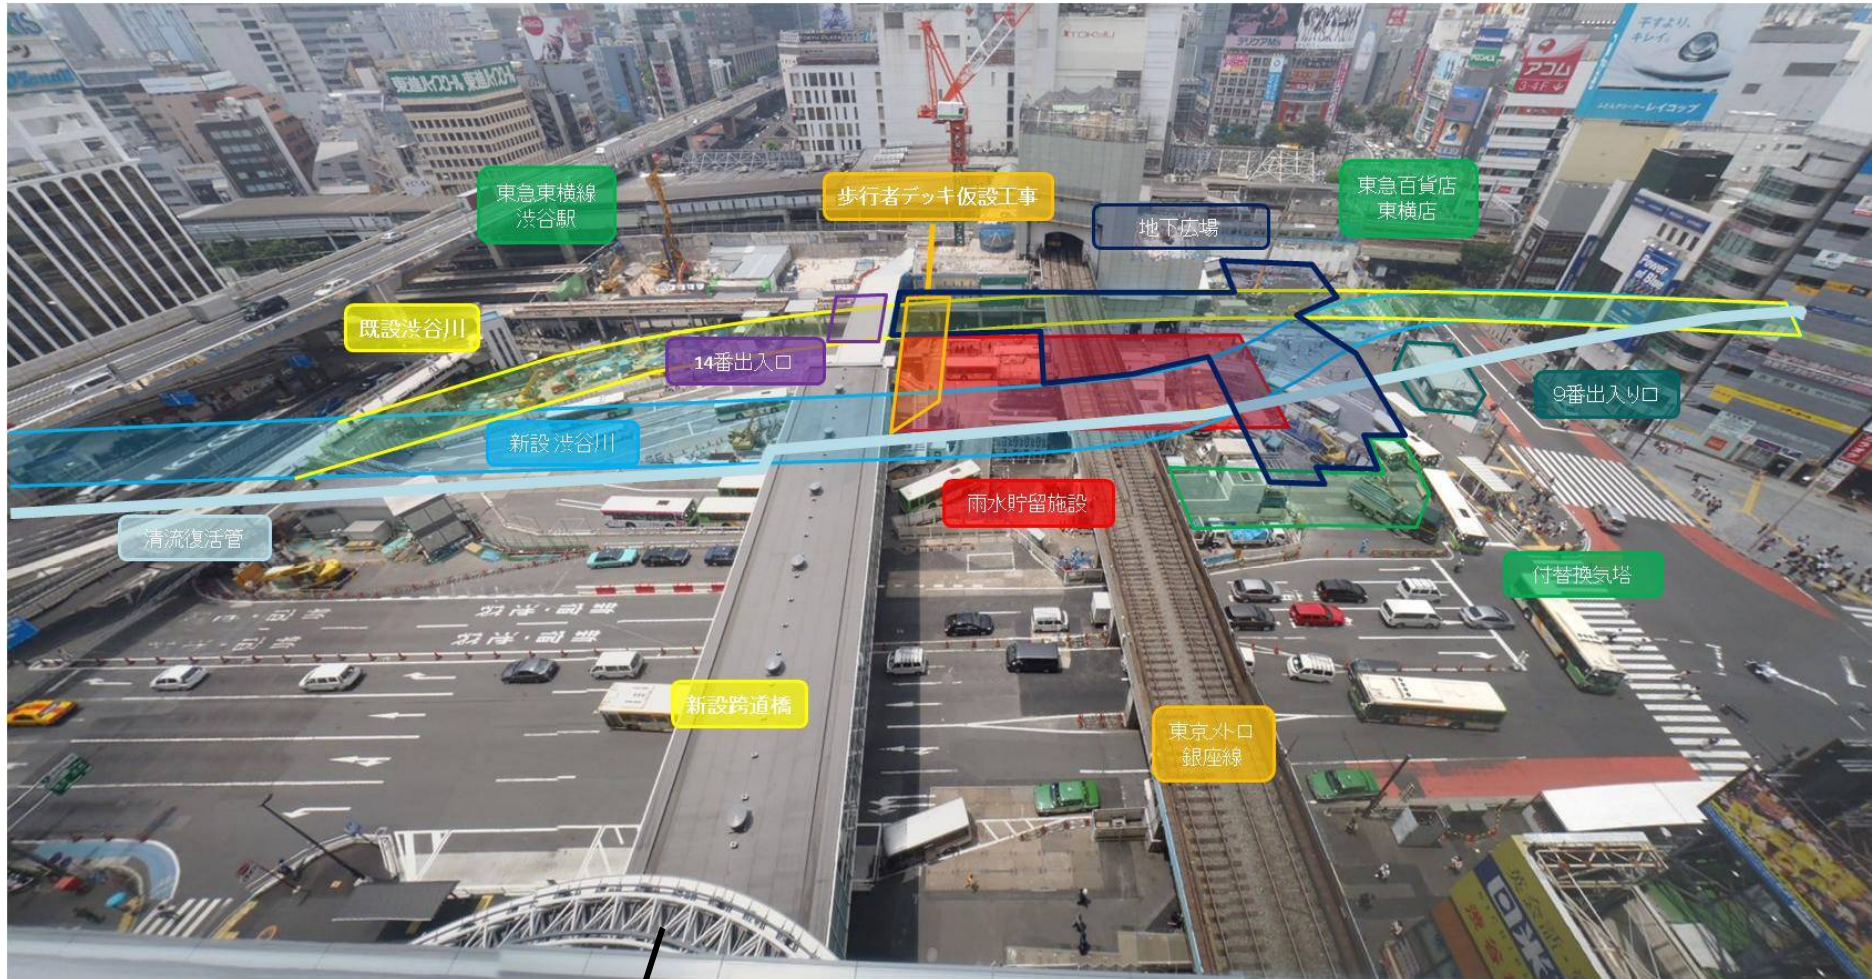

ヒカリエ



渋谷駅街区土地区画整理事業に伴う  
渋谷駅東口基礎整備工事(第1工区)

### 3ヶ月間予定工程表

平成26年7月1日～平成26年9月30日




番号	工種	7月				8月				9月				備考
		1	10	20	31	1	10	20	31	1	10	20	30	
①	掘削・土留支保工工事	①												路面覆工下の掘削を進めていきます。また、掘削の進捗に伴い土留が崩壊しないよう山留支保工を順次架設していきます。
②	躯体構築工事 (東口地下広場)	②								以降継続				東口地下広場の構築工事を行います。
③	躯体構築工事 (地下貯留槽)					③				以降継続				防災設備となる地下貯留槽の構築工事を行います。
④	渋谷川移設工事	④								以降継続				旧東急百貨店東横店東1号館跡地で、渋谷川を移設する工事です。仮護岸杭を打設後、覆工を掛け、渋谷川を壊していきます。
⑤	歩行者デッキ架設工事					⑤				以降継続				東棟新築工事の着手に伴い仮設の歩行者デッキを北側に移設する工事です。

# 施工箇所説明写真 渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

⑤歩行者デッキ架設工事

①掘削・土留支保工工事  
③躯体構築工事(地下貯留槽)

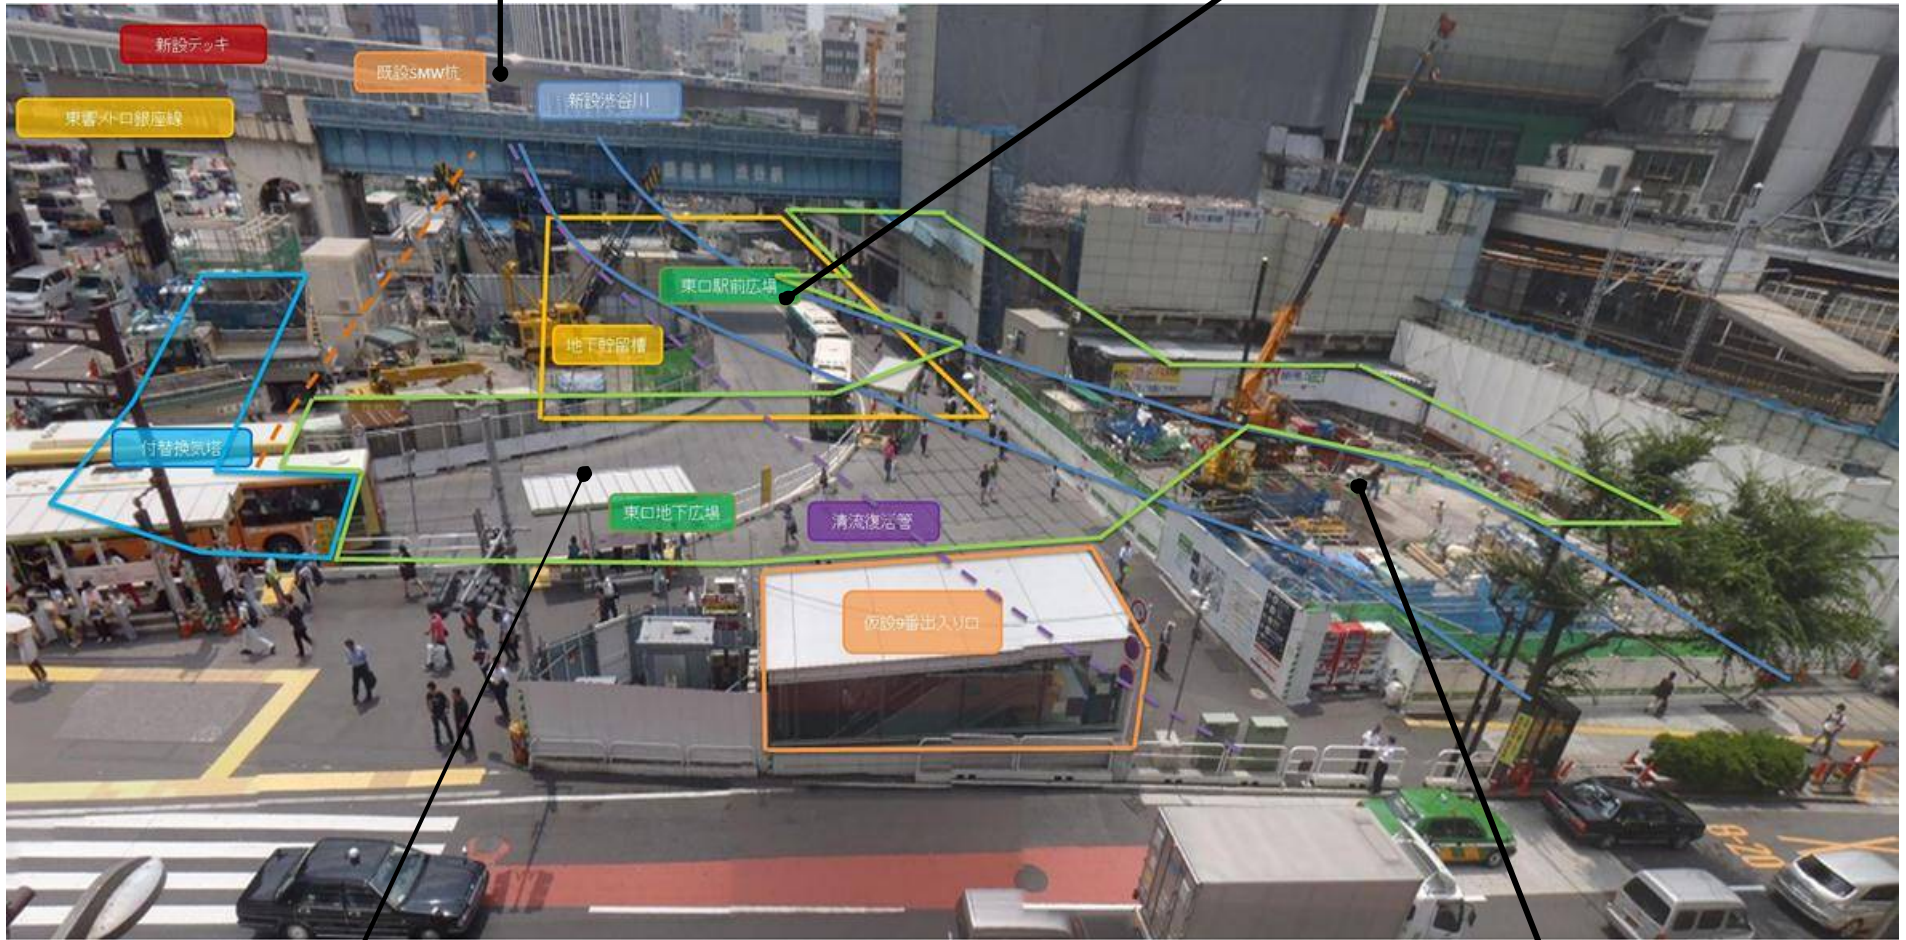

②躯体構築工事(東口地下広場)

④渋谷川移設工事



現場進捗写真(平成26年7月)  
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

①東口バスロータリー全景(北側 H26.4中旬)



②東口バスロータリー全景(北側 H26.7中旬)





現場進捗写真(平成26年7月)  
渋谷駅東口基盤整備工事(第1工区)

③地下広場底版(Aブロック)鉄筋組立完了

