


渋谷駅街区土地区画整理事業に伴う
渋谷駅西口地下タワシプールインアウトラ整備工事

令和 5年 5月度 月間予定工程表

施工者 東急・大成建設共同企業体
渋谷基盤整備工事事務所

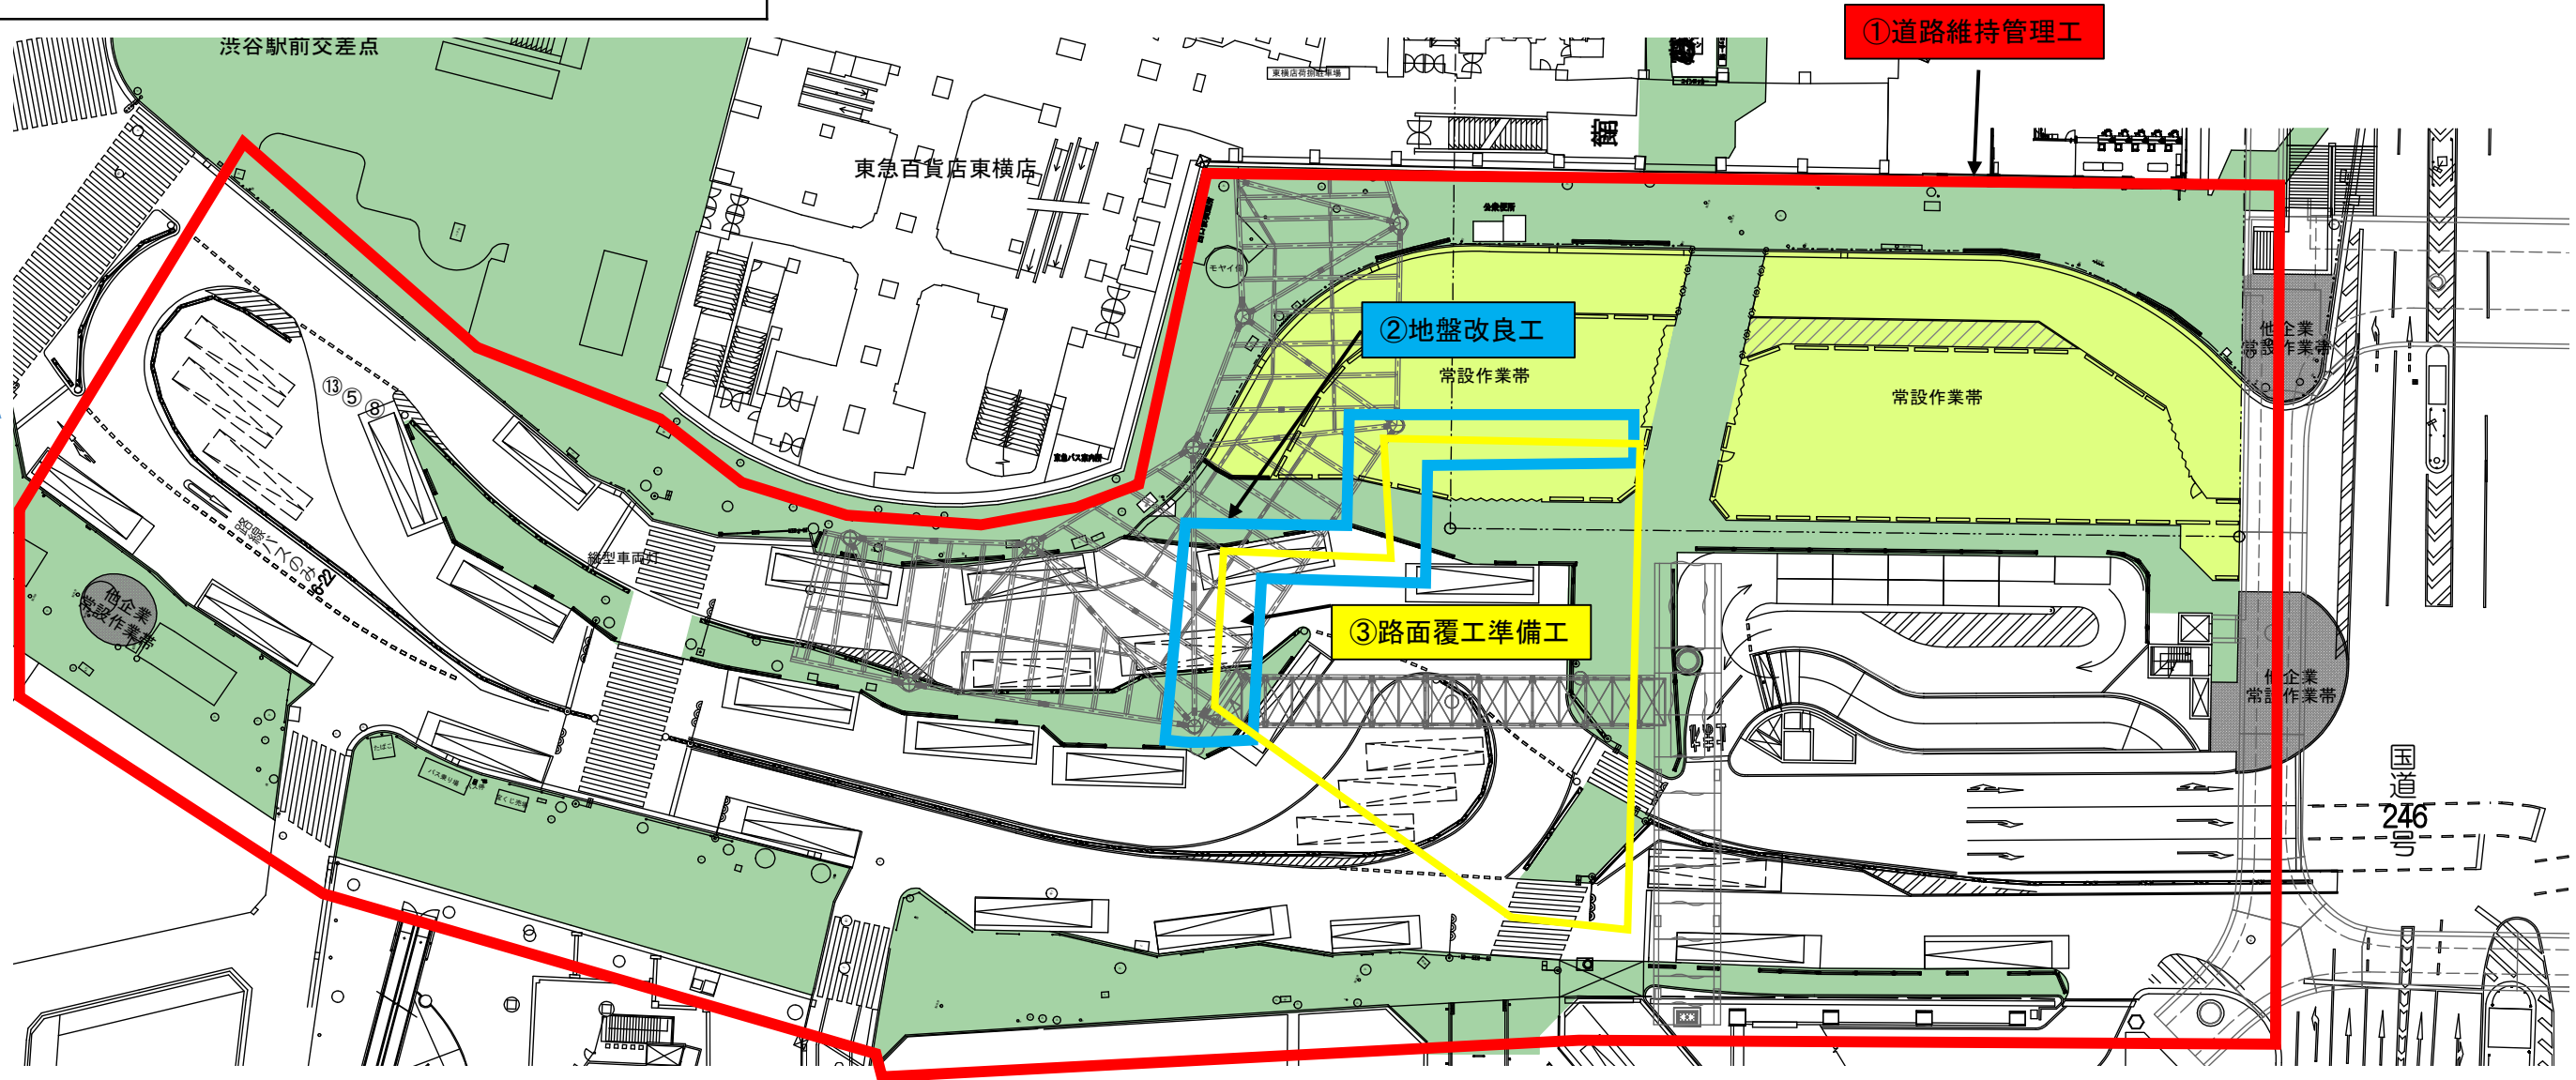

番号	工 種	5月						備 考
		1	5	10	15	20	25	
①	道路維持管理工							西口駅前広場の道路維持管理を行う工事です。
②	地盤改良工							土留背面地盤を止水するための地盤改良工事です。
③	路面覆工準備工							道路に覆工板を設置するための準備をする工事です。
